


Penjadwalan Proyek

Tugas 4 — Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB)
Kandidat: Joe Aryadharma | Durasi Proyek: 3 Bulan (12 Minggu)

1. Gantt Chart Timeline Proyek

Penjadwalan proyek SIPB divisualisasikan menggunakan Gantt Chart yang membagi pengembangan ke dalam 6 Sprint selama 12 minggu. Setiap sprint berdurasi 2 minggu dengan total estimasi 236 Man-Days.

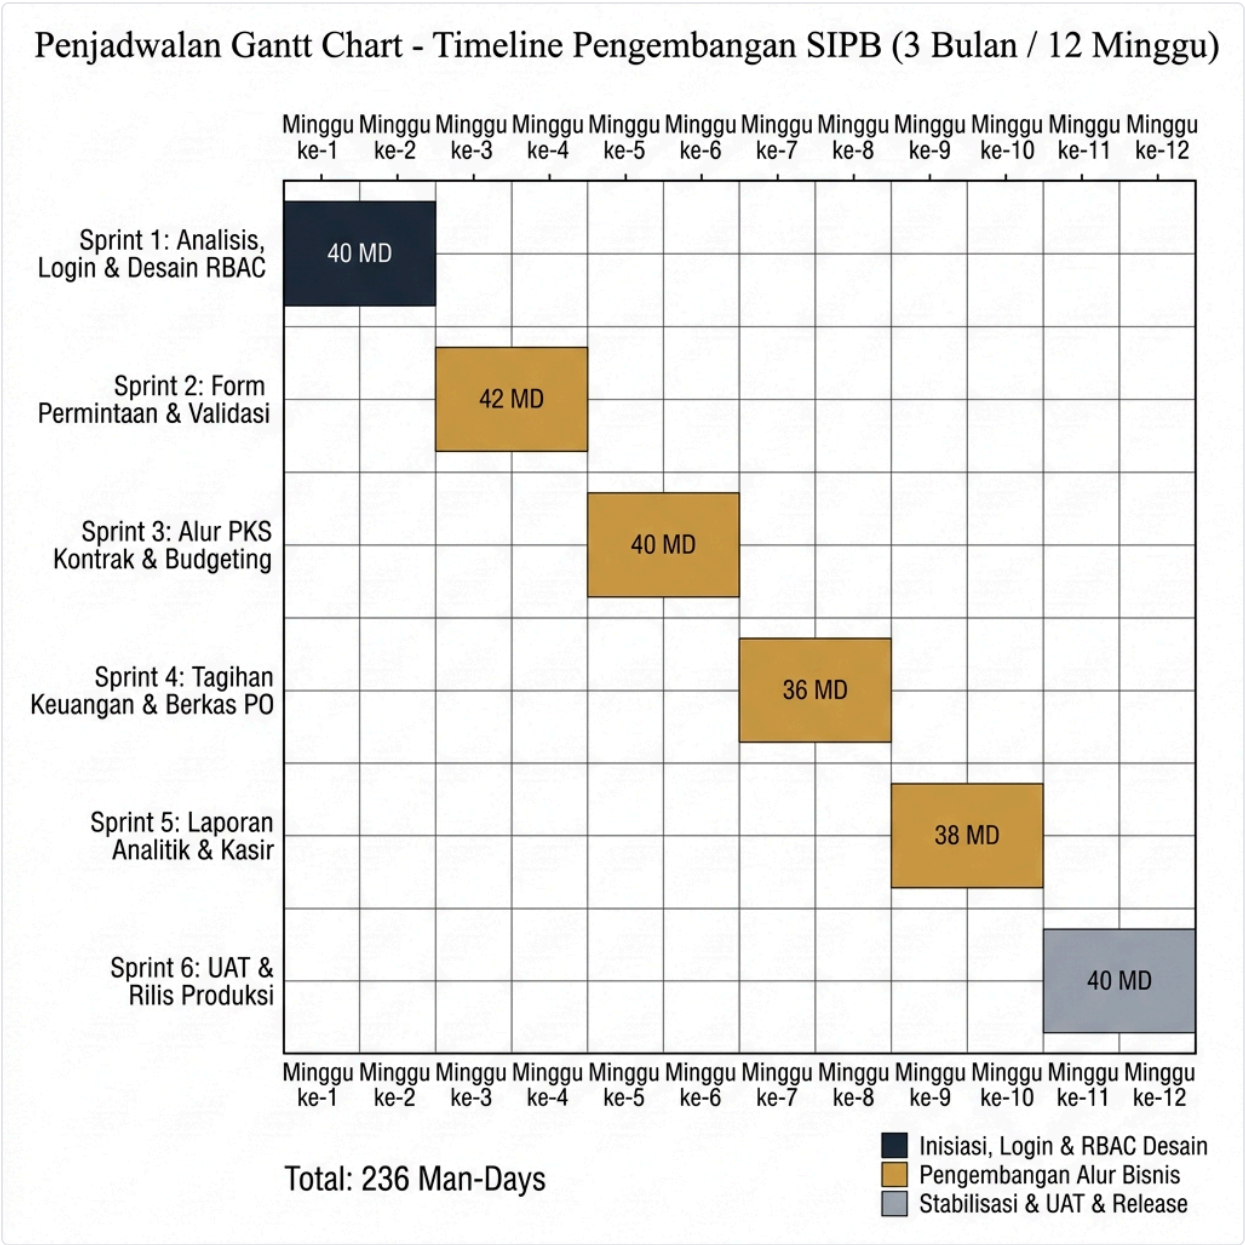

Gambar 4.1 — Gantt Chart Penjadwalan Pengembangan SIPB (3 Bulan / 12 Minggu)

2. Rincian Penjadwalan per Sprint

Sprint	Periode	Fokus Pengembangan	Milestone	Man-Days
Sprint 1	Minggu 1–2	Analisis, Login & Desain RBAC	- Analisis kebutuhan user selesai - Skema database (ERD) tervalidasi - Halaman login fungsional - Arsitektur RBAC terimplementasi	40
Sprint 2	Minggu 3–4	Form Permintaan & Validasi	- Form pengajuan multi-item berfungsi - Tabel antrean Procurement aktif - Mekanisme approve/reject + alasan - Tabel verifikasi Budgeting aktif	42
Sprint 3	Minggu 5–6	Alur PKS Kontrak & Budgeting	- Form PKS Kontrak multi-item berfungsi - Input termin pembayaran aktif - Auto-generate nomor Draft PO - Upload bukti PO berfungsi	40
Sprint 4	Minggu 7–8	Tagihan Keuangan & Berkas PO	- Form tagihan dengan prefill item - Upload invoice berfungsi - Auto-kalkulasi nominal tagihan - Integrasi data PKS → Tagihan	36
Sprint 5	Minggu 9–10	Laporan Analitik & Kasir	- Modal pencairan Kasir berfungsi - Validasi nominal vs sisa pagu - Dashboard analitik Chart.js - Filter periode (harian/mingguan/bulanan/tahunan)	38
Sprint 6	Minggu 11–12	UAT & Rilis Produksi	- User Acceptance Testing selesai - Kompilasi APK Android final - Deploy PWA ke Vercel - Dokumentasi final lengkap	40
Total Man-Days				236

3. Fase Pengembangan

Gantt Chart membagi timeline ke dalam 3 fase warna berbeda:

Fase	Warna	Sprint	Deskripsi
------	-------	--------	-----------

Inisiasi	Navy (#1f2937)	Sprint 1	Fondasi teknis: analisis kebutuhan, desain arsitektur, implementasi login & RBAC.
Pengembangan Alur Bisnis	Gold (#c99743)	Sprint 2–5	Implementasi seluruh modul alur bisnis pengadaan: permintaan, validasi, PKS, tagihan, pencairan, dan pelaporan.
Stabilisasi & Release	Silver (#9ca3af)	Sprint 6	Pengujian akhir (UAT), perbaikan bug, kompilasi mobile, deploy produksi, dan dokumentasi final.

4. Dependensi Antar-Sprint

Setiap sprint memiliki dependensi terhadap sprint sebelumnya karena alur bisnis SIPB bersifat sekuensial (hulu ke hilir). Sprint 2 tidak dapat dimulai tanpa fondasi RBAC dari Sprint 1, Sprint 3 bergantung pada form permintaan dari Sprint 2, dan seterusnya. Dependensi ini memperkuat alasan pemilihan model Agile Scrum yang mendukung pengembangan bertahap sesuai urutan alur bisnis.
